

## 令和3年度三田市強靱化計画進捗状況について

三田市強靱化計画は、国土強靱化基本法に基づき、大規模自然災害が起こっても機能不全に陥らず、よりしなやかな地域の構築をめざし、令和2年10月に策定しました。

計画期間は、令和2年度（2020年度）から令和6年度（2024年度）の5年間であり、令和6年度の目標に向け、強靱化を推進する72事業について進捗管理を行っています。


### 1 進捗管理の考え方

- ①令和2年度の実績を基準値とし、最終年度（R6年度）の目標値を100%に設定します。
- ②各年度の目標値は、R3年度～R6年度を按分し定めます。
- ③各年度目標値における達成度を評価します。

A: 計画どおりの進捗、又それ以上に進捗している事業	達成度 100%以上
B: 一定程度進捗している事業	達成度 60%以上～100%未満
C: 目標を大幅に下回っている事業	達成度 10%以上～60%未満
D: 進捗がない事業	達成度 10%未満

(例)

基準値 (R2 実績進捗率)	20%
R3 目標進捗率	40%
R3 実績進捗率	30%
達成度	$(30\%(R3 \text{ 実績進捗率}) - 20\%(基準値)) \div (40\%(R3 \text{ 目標進捗率}) - 20\%(基準値)) \times 100 = 50\%$
達成評価	C

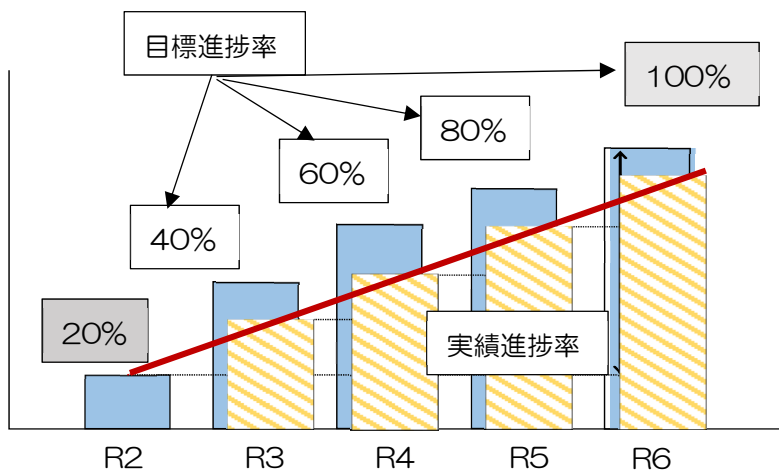

## 2 令和3年度進捗状況について

強靱化を推進する72の事業の進捗状況は以下の通りです。

評価区分	A	B	C	D	R4以降着手予定、又は 災害発生時実施事業	計
事業数	32	10	9	8	13	72
割合	44%	14%	13%	11%	18%	100%

## 3 今後の取組み

評価が順調であった事業については、引き続き継続して取り組みを進めるとともに、低調であった事業については、各事業の問題点を洗い出し、PDCAサイクルによる点検、見直しを行います。
